

【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 E-1-1

事業名 浄化槽設置整備復興事業

事業費 総額 7,284 千円

(内訳:国費(基金) 5,460 千円、村費 1,824 千円)

事業期間 平成24年度～平成30年度

事業目的

東日本大震災により被災し、現在仮設住宅等で生活している住民が、今後高台などに住宅を再建する際に、水洗化を進めるため浄化槽整備が必要である。

公共下水道区域及び漁業集落排水区域以外の地域に住宅を再建する世帯を対象に浄化槽設置を推進するものである。

事業地区

田野畑村内の公共下水道区域及び漁業集落排水事業区域を除く全地域が対象

※別紙の浄化槽設置整備復興事業位置図、写真を参照

事業結果〔整備概要〕

○5人槽 9基 (H24年3基、H25年2基、H26年2基、H27年1基、H30年1基)

○7人槽 8基 (H24年1基、H25年2基、H26年3基、H27年1基、H28年1基)

○10人槽 1基 (H25年1基)

合計 18基 (H24年4基、H25年5基、H26年5基、H27年2基、H28年1基、H30年1基)

事業の実績に関する評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

○ 田野畑村の水洗化率向上が図られ、住環境が改善した。

⇒ 上記を踏まえ、本事業は事業目的に即した効果を発揮していると判断する。

② コストに関する調査・分析・評価

○ 岩手県会計規則等に基づき契約手続きを行っており、事業費積算においては建築基準法で定める建築面積に基づく人槽を基本とし、岩手県浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱等の算定根拠を用いている。

⇒ 上記を踏まえ、本事業に要したコストは妥当と判断する。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

	想定事業期間	実際の事業期間
補助金交付	平成24年度～平成30年度	平成24年度～平成30年度


○ 本事業は事業期間内で完了している。

⇒ 想定事業期間内で整備を終えており、事業期間として妥当であったと判断する。


事業担当部局

田野畑村 地域整備課 (漁港・住宅班) 電話番号: 0194-34-2111

浄化槽設置整備復興事業位置図  
(全域図S=1:50000)

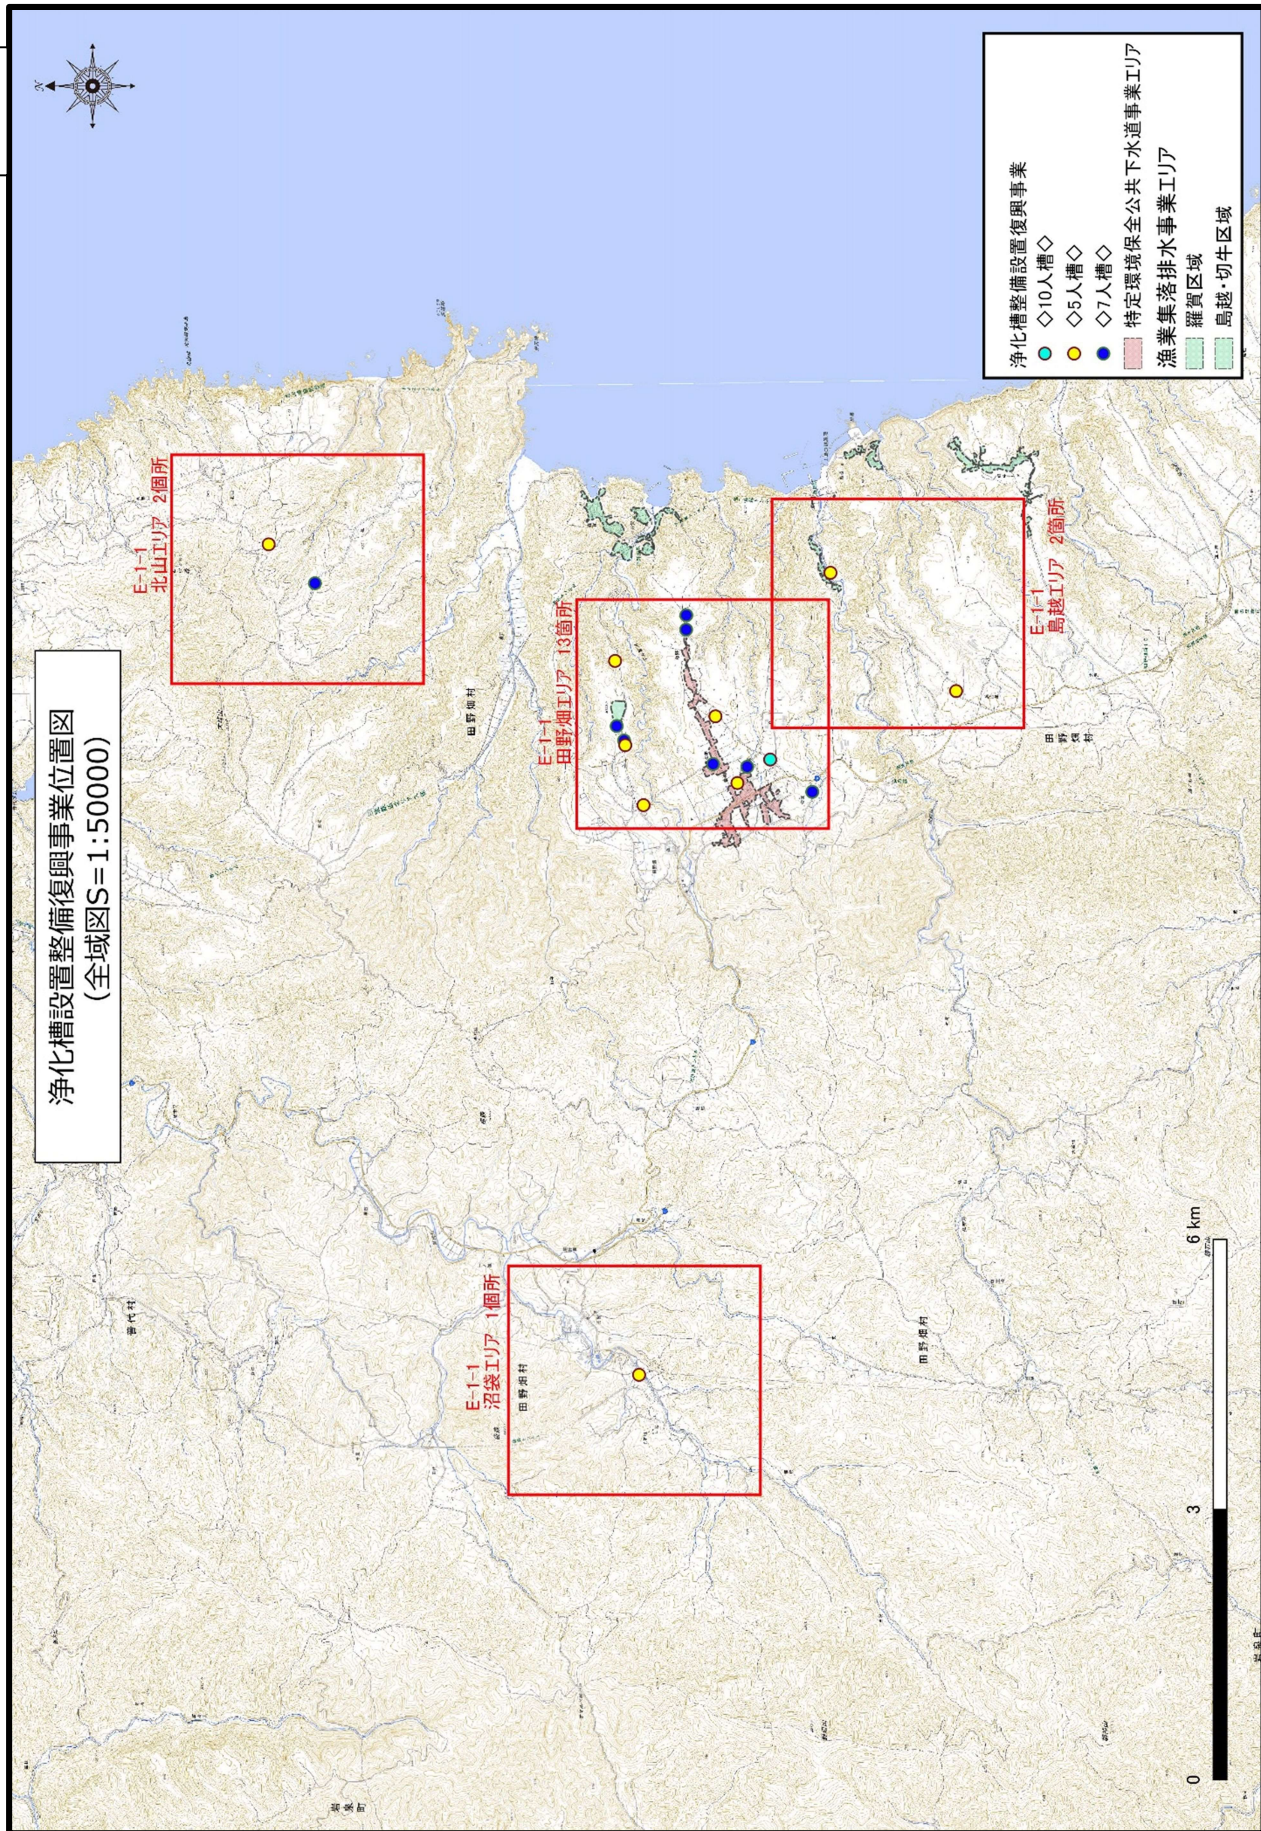


【エリア図1】

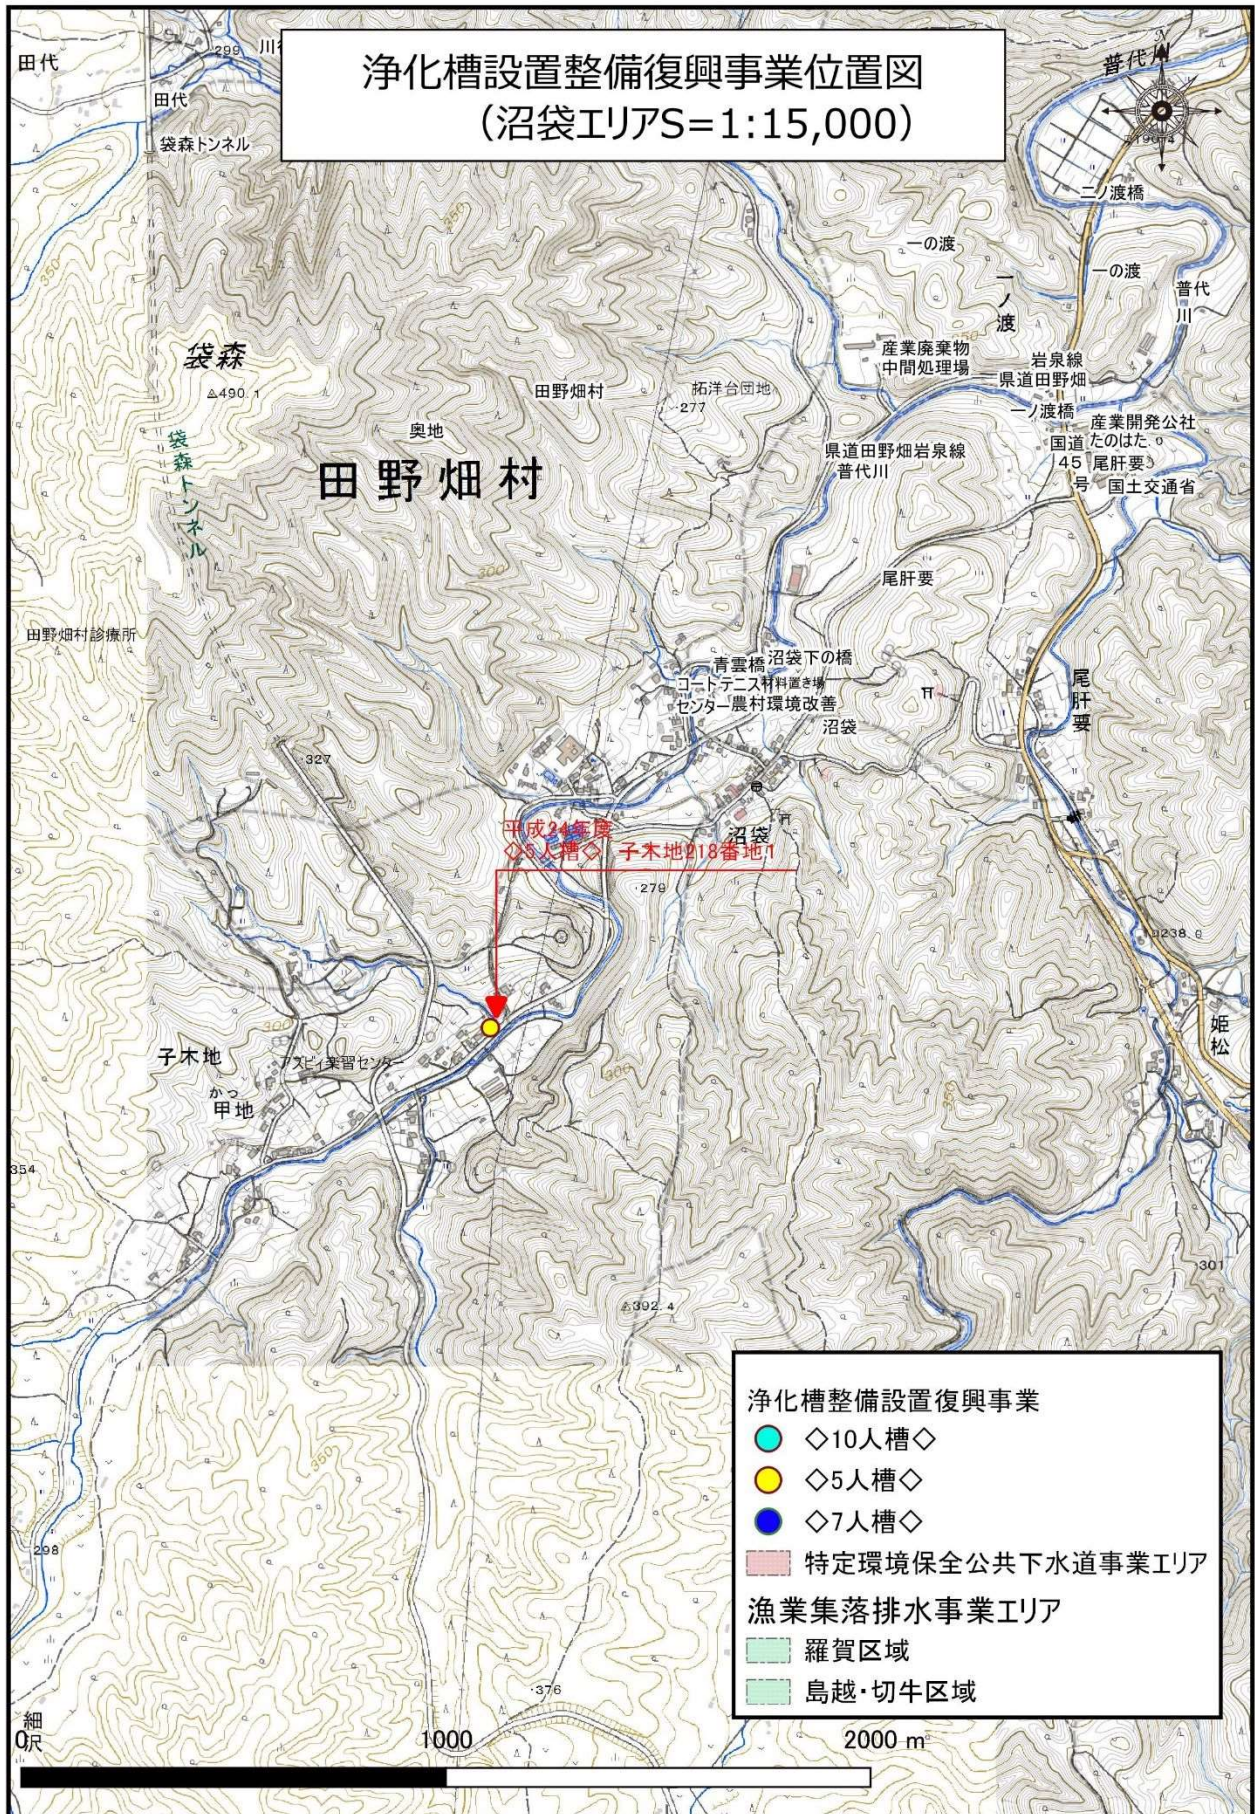


【エリア図2】



【エリア図3】

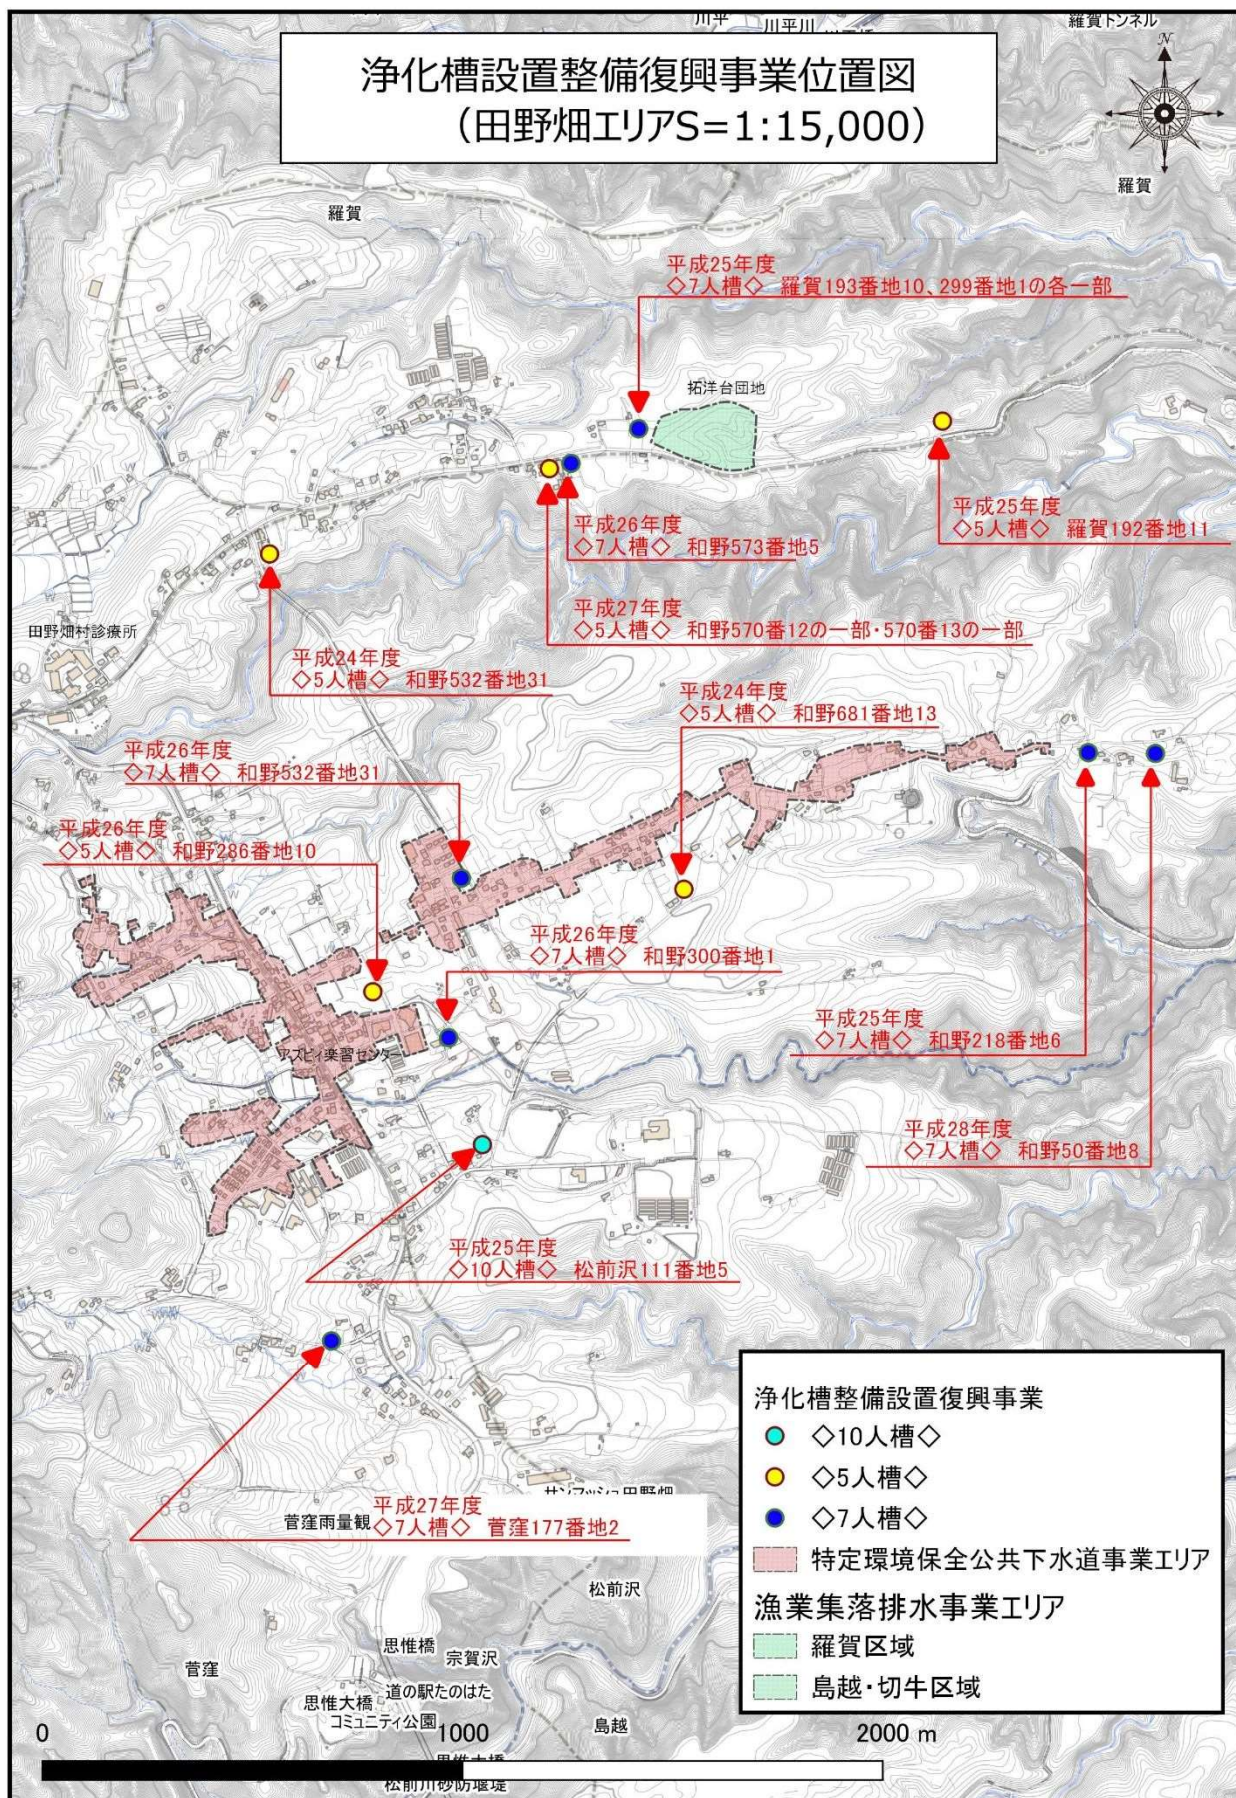

【エリア図4】

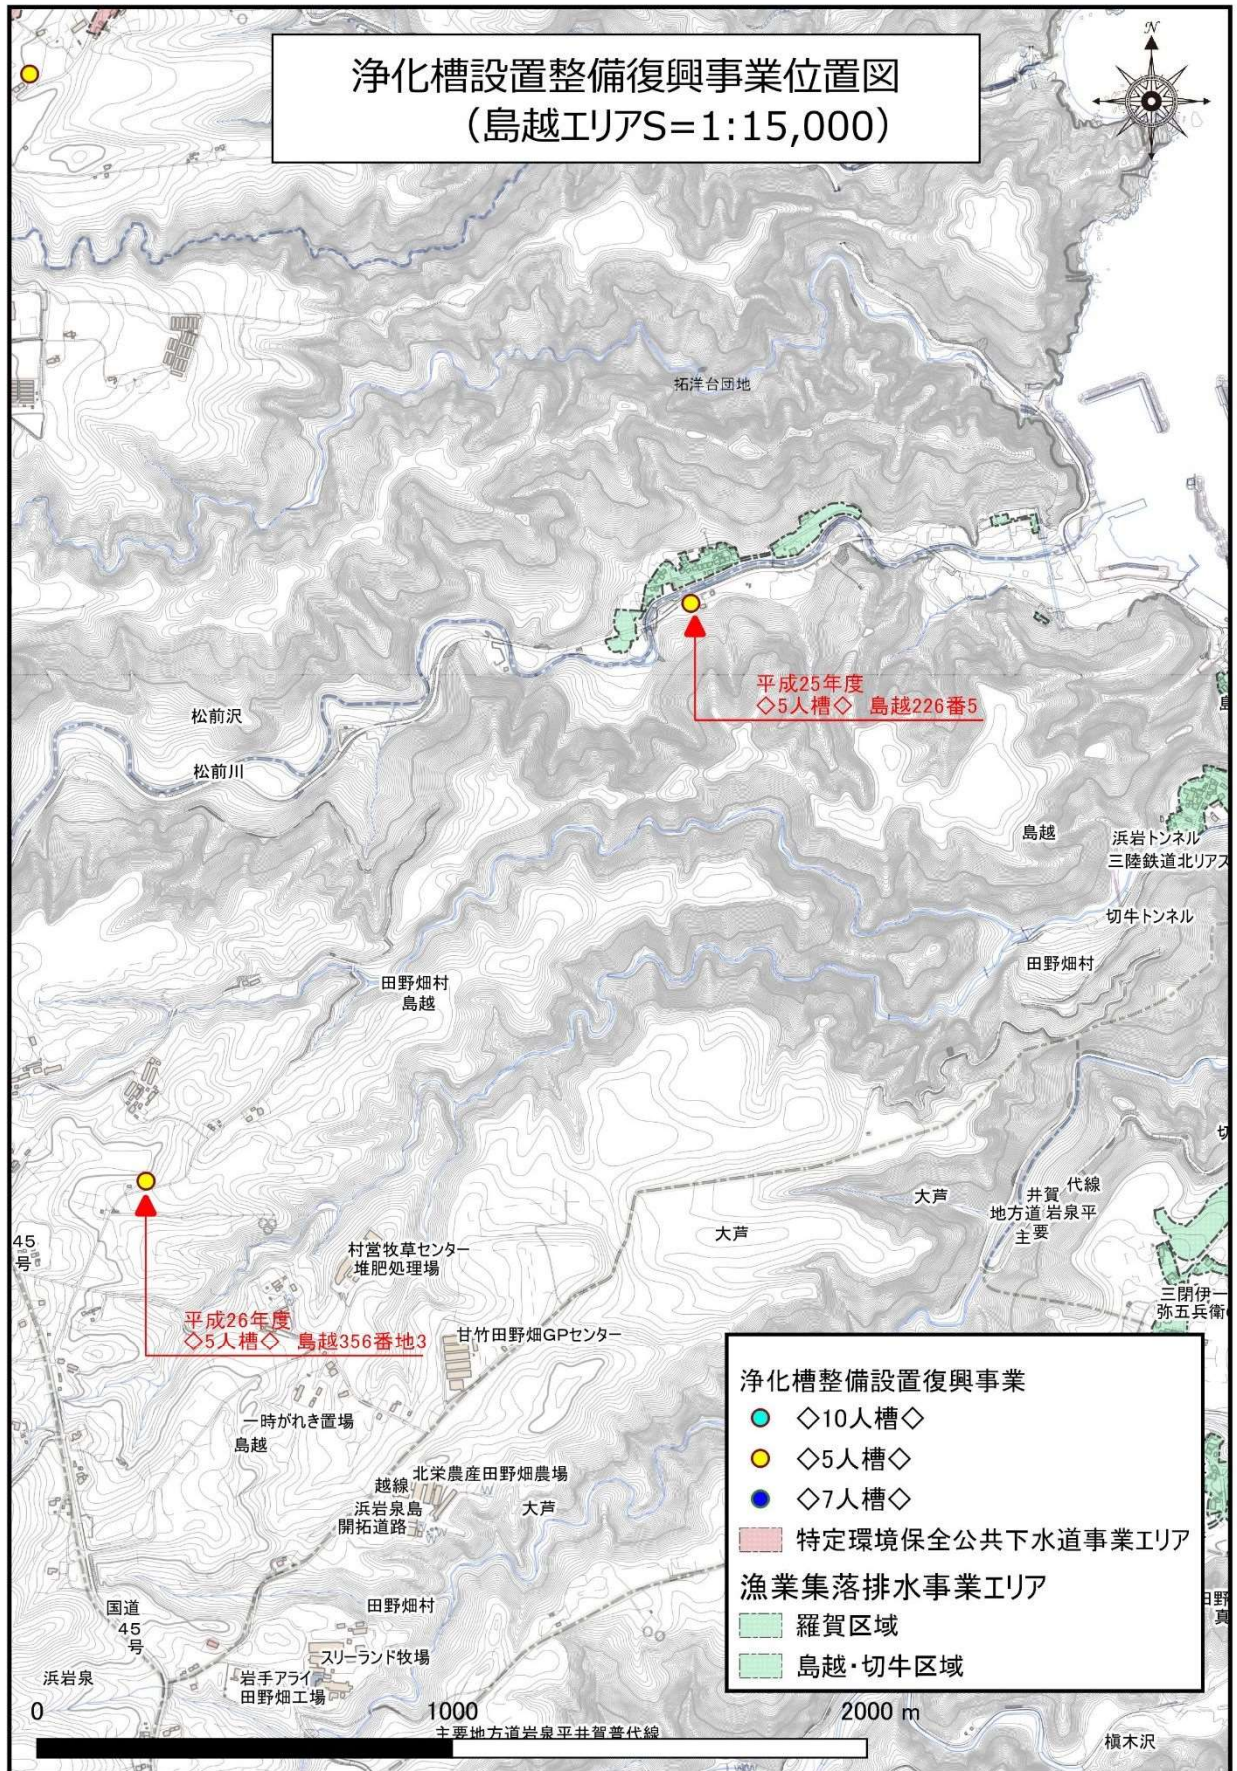

【写真】



〔001〕 20130502島越226番5

◇5人槽◇

…実施年度：H25

位置図：島越エリア



〔003〕 20160701和野50番地8

◇7人槽◇

…実施年度：H28

位置図：田野畑エリア



〔002〕 20131005松前沢111番地5

◇10人槽◇

…実施年度：H25

位置図：田野畑エリア
